

SAE S2.05 — GESTION D'UN PROJET

29/03/2026

Organisation d'une Journée Universitaire sur le Numérique Responsable

« Le numérique responsable : enjeux, usages et perspectives
pour les étudiants »

Abasse KADERBHAI

BUT INFORMATIQUE 1ERE ANNEE
GROUPE CERES

Table des matières

Introduction	2
1. Cadrage du projet et compréhension du cas	2
2. Analyse des besoins et du périmètre du projet	3
2.1. Besoins identifiés	3
2.2. Contraintes du projet	3
2.3. Exigences du projet	3
2.4. Périmètre du projet	4
3. Objectifs du projet et livrables attendus	4
4. Acteurs du projet, organisation et gouvernance	5
5. Répartition des rôles et responsabilités (RACI)	6
6. Découpage du projet en tâches (WBS)	7
7. Planification du projet et dépendance	8
7.1. Planning global du projet	8
7.2. Planning de la journée	9
8. Budget prévisionnel et arbitrage réalisés	9
9. Analyse des risques et modalités de suivi	10
10. Bilan prévisionnel et retour réflexif	11
10.1. Participation des étudiants	11
10.2. Atteinte des objectifs	11
10.3. Organisation et logistique	11
10.4. Analyse globale	11
10.5. Retour réflexif	12
11. Contribution individuelle et prise de recul personnelle	12
11.1. Abasse KADERBHAI	12
11.2. Sofiane DOUVENEAU	13
Conclusion	13

Introduction

Dans un contexte où les usages numériques occupent une place centrale dans la vie quotidienne et universitaire, il devient nécessaire de sensibiliser les étudiants aux conséquences de leurs pratiques. La consommation énergétique des équipements, la protection des données, l'intelligence artificielle, le renouvellement du matériel ou encore l'impact environnemental du numérique sont aujourd'hui des sujets importants, en particulier pour des étudiants amenés à travailler dans le domaine informatique.

Afin de répondre à ce besoin, l'IUT souhaite organiser une journée de sensibilisation intitulée « Le numérique responsable : enjeux, usages et perspectives pour les étudiants », prévue le jeudi 14 mai 2026. L'événement a pour but d'informer les étudiants du département Informatique, de leur donner des repères concrets et de favoriser les échanges avec des enseignants, des associations étudiantes et des intervenants extérieurs.

Ce dossier présente la démarche de gestion de projet retenue pour préparer cette journée. Il détaille le cadrage initial, les besoins identifiés, les objectifs, les livrables attendus, l'organisation des acteurs, la répartition des responsabilités, la planification, le budget prévisionnel, les risques ainsi que le bilan attendu. L'enjeu n'est pas seulement de décrire l'événement, mais de montrer comment l'équipe projet organise, coordonne et arbitre les décisions malgré des contraintes de temps, de budget et de dépendance entre acteurs.

La date du 14 mai 2026 étant imposée et le budget limité à 2000€, plusieurs choix doivent être assumés. Le projet privilégie donc une organisation réaliste : un format principalement présentiel, des stands interactifs, des interventions ciblées et une mobilisation progressive des acteurs internes et externes.

1. Cadrage du projet et compréhension du cas

L'université souhaite renforcer ses actions en faveur du numérique responsable en organisant une journée universitaire dédiée à cette thématique. L'événement doit être visible, crédible et cohérent avec les valeurs de l'établissement, sans mobiliser des moyens excessifs.

L'équipe projet n'a pas pour rôle d'exécuter seule toutes les actions. Son rôle principal est de cadrer le projet, coordonner les acteurs, planifier les étapes, anticiper les risques et proposer des arbitrages lorsque les contraintes deviennent fortes.

Elément de cadrage	Choix retenu
Intitulé	Le numérique responsable : enjeux, usages et perspectives pour les étudiants
Date	Jeudi 14 mai 2026, date non négociable
Public prioritaire	Etudiants du département Informatique, environ 300 étudiants
Objectif général	Sensibiliser les étudiants aux enjeux du numérique responsable
Budget maximal	2000 € pour l'ensemble de l'évènement
Format privilégié	Présentiel, avec stands interactifs et interventions

2. Analyse des besoins et du périmètre du projet

2.1. Besoins identifiés

Le projet répond aux besoins suivants :

- Manque de sensibilisation des étudiants du département informatique (environ 300 étudiants) aux enjeux du numérique responsable
- Manque d'information claire et accessible sur ces enjeux
- Besoin de rendre les étudiants plus responsables dans leurs usages numériques
- Volonté de l'université de promouvoir une démarche de numérique responsable

2.2. Contraintes du projet

Le projet doit respecter les contraintes suivantes :

- Date imposée : 14 mai 2026
- Budget limité à 2000€
- Lieu : IUT (espaces disponibles comme le hall ou les salles)
- Public cible : étudiants de l'IUT département informatique
- Validation nécessaire par le service communication, le service logistique et la direction de l'IUT
- Dépendance à plusieurs acteurs : enseignants, association étudiante, intervenants externes
- Nombre d'étudiants concernés : environ 300
- Capacité limitée des espaces d'accueil
- Nécessité de gérer les flux d'étudiants
- Contraintes liées aux emplois du temps

2.3. Exigences du projet

Exigences fonctionnelles : Permettre	Exigences non fonctionnelles : Respecter
Informar les étudiants sur les enjeux du numérique responsable	Budget de 2000€
Proposer des échanges entre étudiants et intervenants	Date imposée
Favoriser la participation des étudiants	Image et valeurs de l'université
Assurer une diffusion efficace de l'information avant l'événement	Accessibilité pour l'ensemble des étudiants
	Organisation logistique fluide
	Communication claire et anticipée

2.4. Périmètre du projet

Prise en charge	Pas pris en charge
L'organisation de l'événement du 14 mai 2026	L'organisation d'événements après le 14 mai 2026
La mise en place d'actions de sensibilisation	La mise en place de formations longues
La communication autour de l'événement	Le développement d'outils numériques complexes (site web, application)
La coordination des intervenants	Le suivi des étudiants après l'événement
L'organisation logistique (espaces, matériel, accueil)	
Le recueil de retours après l'événement	

3. Objectifs du projet et livrables attendus

L'objectif principal est de sensibiliser au moins 150 à 200 étudiants du département informatique (sur environ 300) aux enjeux du numérique responsable au travers de pop-ups présentant des sujets tels que :

- L'activité numérique responsable (cyberharcèlement, préserver l'anonymat...)
- Les lois du numérique (la régulation, la protection, l'innovation et la circulation numérique)
- L'IA et son impact écologique et intellectuel
- Empreinte carbone de notre activité numérique

A organiser pour que l'évènement ait lieu le 14/05/2026 de 10H à 17H et rentre dans un budget de 2000€.

Cet objectif tient compte des absences possibles, des stages, de l'alternance et des contraintes d'emploi du temps.

Objectifs secondaires :

- Assurer une communication claire et anticipée sur l'évènement auprès des étudiants, afin de garantir leur présence, et auprès des directeurs d'études, afin de permettre l'aménagement des emplois du temps.
- Assurer l'encadrement de l'évènement par des professeurs, professionnels et l'association étudiante.
- Garantir la capacité d'accueil de l'ensemble de l'IUT (activités [salles], restauration).
- Aménager les cours des étudiants de l'IUT pour assurer leur présence à l'évènement.

Livrables :

- Liste des intervenants validée
- Plan d'installation des stands
- Plan de communication validé
- Planning global de l'évènement
- Organisation logistique formalisée
- Budget prévisionnel argumenté
- Matrice RACI
- Compte rendu de l'évènement (REX)

4. Acteurs du projet, organisation et gouvernance

Le projet repose sur plusieurs acteurs internes et externes. L'équipe projet doit coordonner ces acteurs sans disposer d'une autorité hiérarchique directe sur eux. La gouvernance doit donc permettre de valider les décisions importantes et de limiter les blocages.

Acteur	Rôle dans le projet
Directeur de l'IUT	Valide le positionnement général, le format et les messages institutionnels
Equipe de projet	Coordonne, planifie, organise les arbitrages et suit l'avancement
Service de communication	Valide les supports de communication et la conformité à la charte graphique
Service logistique	Vérifie les salles, le matériel, le mobilier et les contraintes techniques
Enseignants	Peuvent intervenir et aider à encadrer certaines activités
Association étudiante	Aide à mobiliser les étudiants et à diffuser l'information
Acteurs externes	Apportent une expertise professionnelle ou associative
Etudiants	Public cible de la journée
Sécurité	Garantit le bon déroulement et la circulation dans les espaces

Les incontournables :

Directeur de l'IUT
Service de Communication
Service Logistique

MOE : Enseignants, Asso. Étudiante, Acteurs externes, Nous, Sécurité

MOA : Directeur de l'IUT

Chef de projet : Nous

Equipe de projet : Nous

Clients : Étudiants de l'IUT

PMO : Service de communication, Service logistique

Contributeurs : Partenaires


Gouvernance retenue :

- Réunion de cadrage avec la direction pour valider le format général.
- Points réguliers avec le service communication et le service logistique.
- Validation des supports avant diffusion.
- Suivi de l'avancement à l'aide du planning, du WBS et de la matrice RACI.
- Arbitrages rapides en cas de dépassement de budget, d'indisponibilité ou de retard.

5. Répartition des rôles et responsabilités (RACI)

Colonne 1	Nous	Enseignants	Asso. Étudiante	Acteurs externes	Restaurateurs	Service Comm.	Service Logistique	Directeur de l'IUT	Service de sécurité	Étudiants de l'IUT
Définition des activités	R	A	C	C	I	C	I	A	I	I
Plannification de l'aménagement des stands	R	C	C	I	I	I	A	I	I	I
Aménagement des stands	R	I	C	I	I	I	A	I	I	C
Intervention	C	A	C	R	I	I	I	I	I	I
Validation du format de l'évènement	C	R	C	I	I	I	I	A	I	I
Transmission de capital	R	C	A	I	I	I	I	I	I	I
Validation du format de promotion	C	R	C	I	I	A	I	I	I	I
Communication	C	I	R	I	I	A	I	I	I	I
Promotion	R	I	C	I	I	A	I	I	I	C
Logistique	C	I	I	I	I	I	A	I	I	I
Accueil des clients	R	I	C	I	I	I	I	I	I	C
Assurance de la sécurité	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I
Restauration	I	I	I	I	R	I	C	I	C	I
Création d'un sondage	R	C	C	I	I	I	I	I	I	C
Rédaction d'un compte rendu	R	C	C	I	I	I	I	I	I	I

6. Découpage du projet en tâches (WBS)

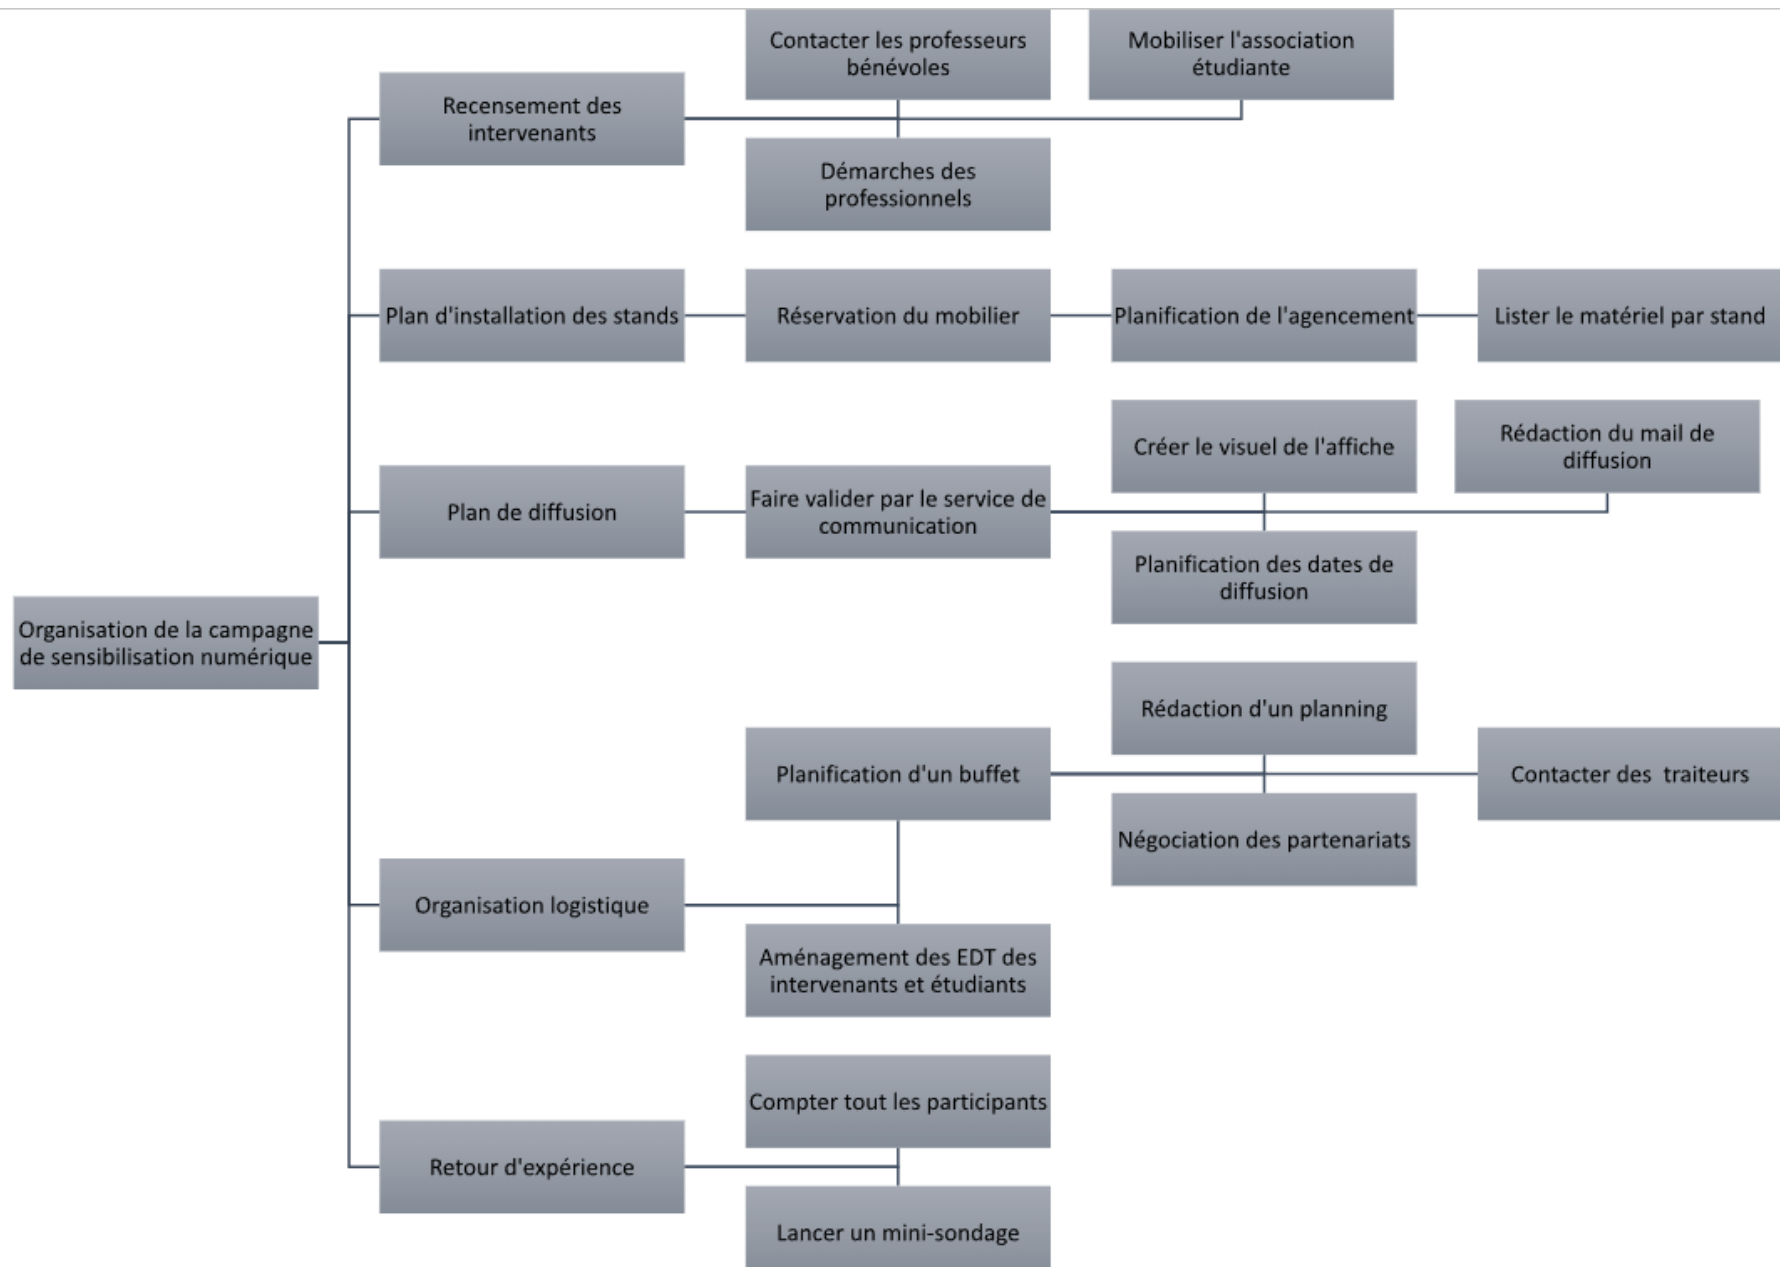

7. Planification du projet et dépendance

7.1. Planning global du projet



7.2. Planning de la journée

- 5 stands interactifs : (libre de circuler)
- 10 professionnels bénévoles : 2/stands
- Activités diverses et variées en lien avec l'informatique : 15-20mins/stands
 - Mini quiz, vrai / faux, chiffres de sensibilisation sur l'impact carbone du numérique
 - Sensibiliser sur les bonnes pratiques pour réduire l'empreinte numérique
 - Sensibiliser à l'exploitations des données et aux droits des utilisateurs
 - Estimer l'impact numérique d'un étudiant
 - Faire comprendre l'importance du cycle de vie du matériel (téléphone démonté, composants,
 - Exemples de reconditionné et recyclage...)

IUT : (créneaux) [gratuit]

- ✓ Activités principales qui aura pour but de sensibiliser les étudiants en échangeant avec des professionnels, sur :
 - L'impact écologique de l'informatique (30- 40 min)
 - Les droits en lien avec l'exploitation de données (30- 40 min)
- ✓ Diffusion d'un épisode de Black Mirror en lien avec le numérique responsable (1H) / Épisode différent en fonction des salles (2/3 salles ?)
- ✓ Activité fresque sur le changement climatique (1H30)

10 groupes de 30 élèves pour occuper les 300 étudiants. Les étudiants devront nous informer 2 semaines avant l'évènement s'ils veulent être regroupés avec des personnes spécifiques (5 personnes max).

8. Budget prévisionnel et arbitrage réalisés

Le budget maximal est de 2 000 €. Le budget prévisionnel retenu atteint 1 934 €, ce qui laisse une marge de sécurité de 66 €. Cette marge est faible : elle impose de limiter les dépenses non indispensables et de privilégier les contributions bénévoles ou internes.

Poste de dépense	Détail	Montant estimé
Mobilier pour les stands	Tables louées : 4 tables par stand, 5 stands, environ 8€ par table	160€
Supports de stand	Roll-ups / kakemonos à bas coût, ~40€/stand	200€
Jeux et matériel d'activité	~30€/stand	150€
Impression	Cartouches, papier et support imprimés	30€
Restauration Crous	Option pour ~60% des étudiants : 180 repas à 3,30€	594€
Compléments alimentaires	Bar salade / viande halal/ grains	700€
Accueil intervenants	En-cas et boissons pour les intervenants	100€
Total prévisionnel	Budget inférieur au plafond de 2000 €	1934€

Arbitrages :

- Le format présentiel est privilégié pour éviter les coûts supplémentaires du format hybride.
- Les intervenants bénévoles sont privilégiés afin de préserver le budget.
- La restauration est dimensionnée pour une participation réaliste et non pour 100 % des étudiants.
- Les objets de démonstration sont récupérés auprès des techniciens ou intervenants lorsque cela est possible.
- La communication reste simple afin de ne pas réduire le budget disponible pour la logistique.

9. Analyse des risques et modalités de suivi

L'analyse des risques permet d'anticiper les événements pouvant fragiliser le projet. Les risques les plus importants concernent les intervenants, le budget, la restauration et les dépendances aux validations.

Déclencheurs	Nature	Origine	Conséquences	Actions correctives	Criticité
Traiteurs incapables de fournir des options alimentaires (halal, végétarien, végane) à un prix dans notre budget.	Financière, Sociale, Organisationnelle	Budget limité, public avec habitudes alimentaires différentes.	Public visé ne mangent pas ce qu'ils peuvent.	Buffets thématiques (Bar à salade/grain, bar viande halal...) produit par nous même ; aller voir un autre traiteur.	Probabilité : 3 Gravité : 3 Déteçtabilité : 2 Criticité = 18 → RISQUE FORT
Les partenaires externes retirent leurs financements.	Financière	Pas convaincu du projet	Les organisations basées sur leurs financements sont invalides.	Faire un plan budgétaire sans compter des aides. Proposer des aménagements complémentaires financés.	Probabilité : 2 Gravité : 4 Déteçtabilité : 3 Criticité = 24 → RISQUE TRÈS FORT
Problèmes de transport.	Incidents ferroviaire ou routière	Problème de coordination des trains ou embouteillage	Retard des personnes concernées.	Concentration des activités principales autour de la pause méridienne.	Probabilité : 2 Gravité : 2 Déteçtabilité : 2 Criticité = 8 → RISQUE FAIBLE
Les intervenants se retirent de manière impromptue.	Réunion urgente ou empêchement.	Entreprise, organisation	Moins de personnes pour gérer les activités	Regrouper 2 intervenants par activités.	Probabilité : 3 Gravité : 4 Déteçtabilité : 3 Criticité = 36 → RISQUE CRITIQUE

Modalités de suivi :

- Suivi hebdomadaire de l'avancement à partir du planning.
- Relance systématique des acteurs en attente de confirmation.
- Point budget après chaque décision d'achat ou de réservation.
- Validation formelle des supports de communication avant diffusion.
- Mini-sondage et comptage des participants après l'événement.

10. Bilan prévisionnel et retour réflexif

10.1. Participation des étudiants

La participation des étudiants est prévue comme obligatoire dans le cadre de l'IUT.

Cependant, une participation totale des 300 étudiants n'est pas réaliste en raison de plusieurs facteurs :

- Etudiants en alternance ou en stage
- Absences (maladie, empêchement)
- Absences non justifiées

Ainsi, la participation prévisionnelle est estimée entre 220 et 260 étudiants.

Cette estimation permet d'anticiper :

- L'organisation des flux
- La capacité d'accueil
- Les besoins logistiques

10.2. Atteinte des objectifs

- Objectif principal : atteint
→ la majorité des étudiants est sensibilisée malgré les absences
- Objectifs secondaires :
 - Communication : atteinte
 - Organisation logistique : partiellement atteinte (ajustements nécessaires)
 - Participation : atteinte compte tenu des contraintes réelles
 - Budget : atteint

10.3. Organisation et logistique

L'organisation devra tenir compte du nombre élevé d'étudiants présents simultanément.

Des ajustements seront nécessaires pour :

- Eviter la saturation des espaces
- Organiser la circulation des étudiants
- Répartir les participants sur différents temps ou zones

10.4. Analyse globale

Le projet est considéré comme réussi si :

- La majorité des étudiants participe
- Les objectifs de sensibilisation sont atteints
- L'événement reste fluide malgré le volume de participants

Les écarts entre le prévu et le réel sont considérés comme normaux et liés aux contraintes humaines et organisationnelles.

10.5. Retour réflexif

Le projet a permis de mettre en évidence plusieurs éléments importants en gestion de projet.

Tout d'abord, la phase de cadrage s'est révélée déterminante. Certaines imprécisions initiales, notamment sur les objectifs et le périmètre, ont entraîné des ajustements en cours de projet. Cela montre l'importance de définir clairement les bases dès le début.

Ensuite, la coordination des acteurs a constitué une difficulté majeure. La dépendance aux validations (direction, communication, logistique) a ralenti certaines prises de décision. De plus, mon binôme et moi avons eu quelques désaccords sur certaines approches, mais nous avons réussi à trouver des ententes et des solutions ensemble. Cela a nécessité une adaptation constante et une bonne communication entre les parties.

La gestion logistique a également été un point sensible, notamment en raison du nombre d'étudiants (environ 300). L'organisation des flux et des espaces a nécessité des ajustements pour éviter les problèmes de saturation.

Cependant, certains éléments ont bien fonctionné, notamment la structuration du projet (WBS, planification) et la répartition des tâches. Le travail en équipe a permis d'assurer une avancée régulière du projet.

Enfin, ce projet a permis de mieux comprendre l'importance de l'anticipation, de la communication et de la gestion des dépendances dans un projet.

11. Contribution individuelle et prise de recul personnelle

11.1. Abasse KADERBHAI

Dans ce projet, j'ai participé à la définition du projet et à l'organisation de ses différentes parties, notamment le cahier des charges, les objectifs, le WBS et la matrice RACI. J'ai également pris part aux discussions sur la communication, la coordination entre les membres et l'analyse des risques. De manière générale, j'ai veillé à ce que les différentes parties du dossier restent cohérentes entre elles.

Ce projet m'a permis de mieux comprendre que la difficulté principale en gestion de projet ne se trouve pas seulement dans la réalisation des tâches, mais dans l'organisation, la coordination et la prise de décision. J'ai aussi compris l'importance de bien distinguer les besoins, les objectifs, les livrables et les tâches. Si c'était à refaire, je porterais encore plus d'attention au cadrage initial afin de limiter les ajustements en cours de projet.

11.2. Sofiane DOUVENEAU

J'ai participé à la définition des points clés et des points de vigilance du projet, ainsi qu'à la construction de livrables cohérents. J'ai également contribué à l'identification des acteurs du projet et à la rédaction du budget prévisionnel, en lien avec les choix d'organisation retenus pour la journée.

Cette SAE m'a permis de prendre conscience que la gestion d'un projet repose sur des efforts progressifs et évolutifs. Les livrables changent parfois au fur et à mesure que le projet se précise. La communication entre les membres du binôme et avec les autres acteurs est donc une qualité essentielle pour réussir l'organisation d'un événement contraint par le temps et le budget.

Conclusion

Ce projet nous a permis de voir qu'organiser un événement ne consiste pas seulement à proposer des idées, mais aussi à faire des choix réalistes. La journée sur le numérique responsable doit respecter plusieurs contraintes importantes : une date imposée, un budget limité, des acteurs à coordonner et des validations à obtenir.

Grâce aux différents outils utilisés, comme le WBS, le planning, le budget, la matrice RACI et l'analyse des risques, nous avons pu structurer le projet et mieux anticiper les difficultés possibles. Le format retenu, principalement présentiel avec des stands et des interventions, permet de sensibiliser les étudiants tout en restant cohérent avec les moyens disponibles.

Ce travail nous a surtout montré l'importance du cadrage, de l'organisation et de la communication dans la gestion d'un projet. Même si certains points restent incertains, le projet proposé reste réalisable, cohérent et adapté aux objectifs de l'IUT.
